

椰林小徑藝術走廊




@nccuga_b54

夜光蓄光石鋪面步道 ✨



果夫樓與資訊大樓間椰林小徑

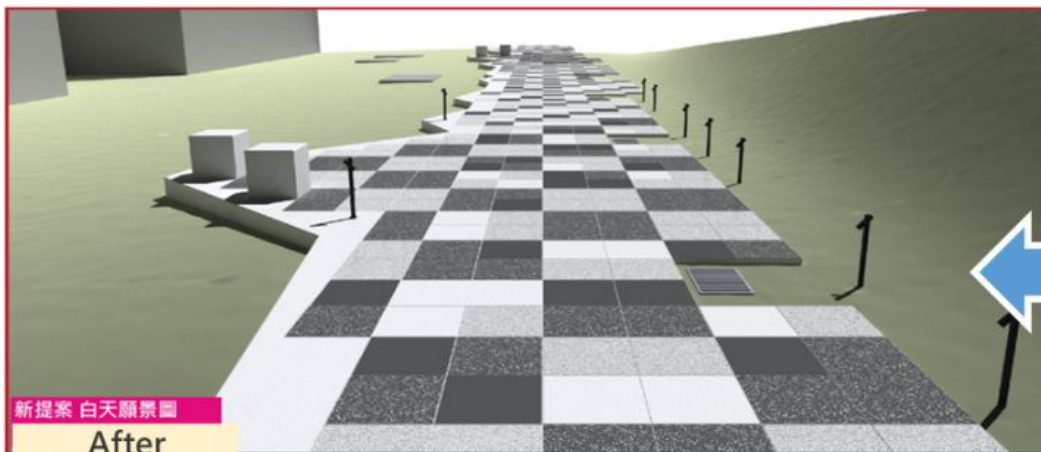


新提案 白天願景圖

After




Before

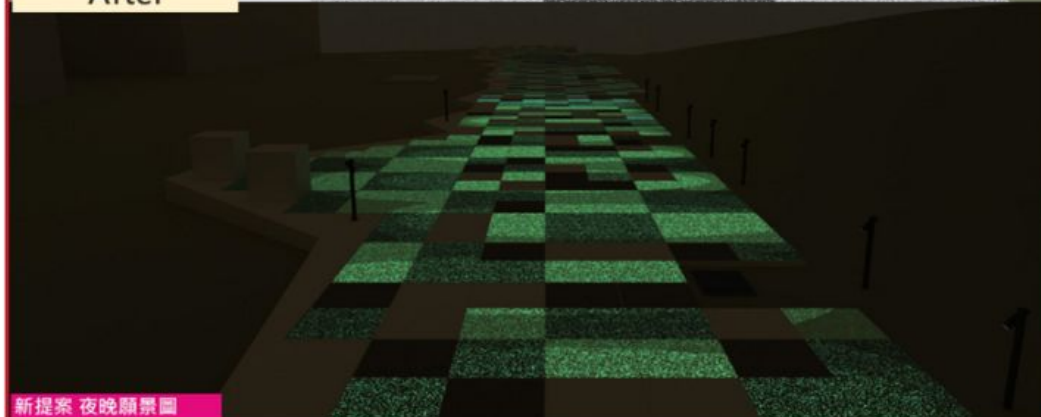

新提案 夜晚願景圖

公共藝術家首次研發-
洗石子蓄光石鋪面

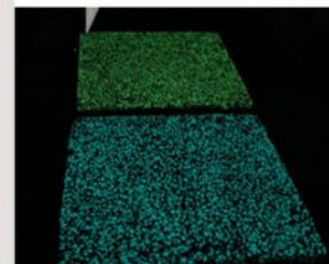

創新材料 ✨

- 節能蓄光石
- 功能性：可提供數小時的低度照明
- 節能環保



預定進度

預定進度表-「研究總中心新建工程及南苑改建學人宿舍興建工程」公共藝術設置計畫委託創作案

工作項目	比例 (%)	進度 (%)	日期																				
			--	5/22	5/29	6/05	6/12	6/19	6/26	7/03	7/10	7/17	7/24	7/31	8/07	8/14	8/21	8/28	9/04	9/11	9/18	--	--
前期工作																							
材料訂製																							
材料加工	20	50																					
進度達 50% 審查: 材料	5	55																					
作品製作(未至現地安裝前, 辦理第二期現勘)	15	70																					
機電	5	75																					
進度達 80% 審查: 作品製作 + 機電	5	80																					
辦理作品驗收	5	85																					
辦理民眾參與活動	5	90																					
全區公共空間基地設計提案 完成	5	95																					
驗收通過後 20 日內提送結 案資料	5	100																					
累計日數				7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126		

工程啟用說明 ✨

案件名稱：「研究總中心新建工程及南苑改建學人宿舍
興建工程」公共藝術設置計畫

開工日	114年5月19日(現場)		
預計竣工日期	契約完工日期114年9月18日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期		
預計114年9月18日竣工 → 竣工查驗/驗收 → 啟用			
啟用日期	本案為公共藝術設置案，由校內外委員進行分階段勘驗及驗收程序，預計竣工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、勘驗、驗收及各階段缺失改善(視委員意見而定，40-60日)，約114年11月17日，如有異動再行通知。		
可能變數：時程因無法進行驗收之情事、新增缺失、契約爭議、建築執照審議程序影響，天候因素(如室外工程遇下雨)，人為因素如學校舉辦研討會請廠商停工、或工程辦理變更設計等。			
