




好漢坡整體 改善進度



@nccuga_b54

自強五舍邊坡預定改善期程說明

(114.06.06更新)

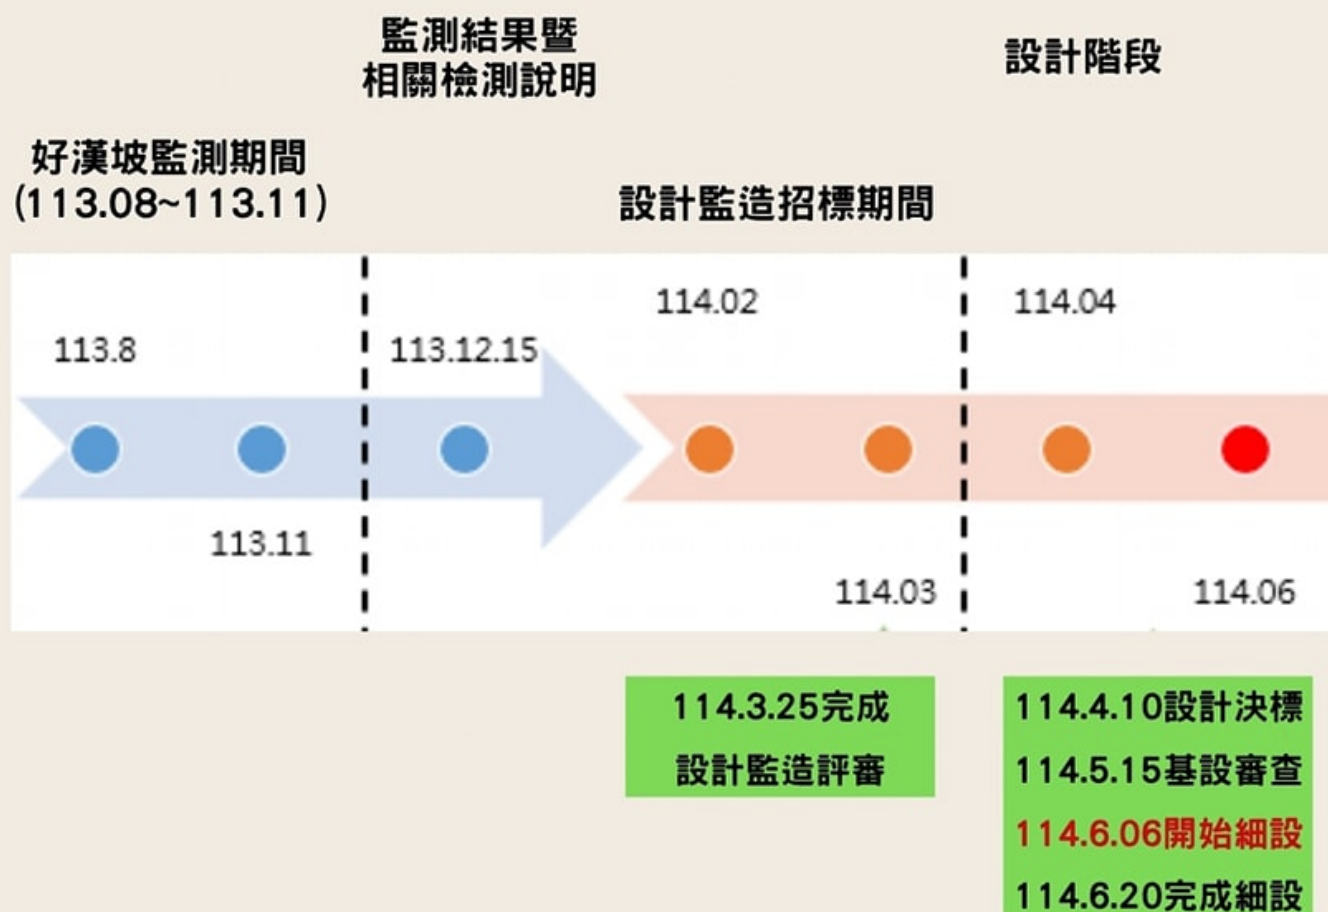


自強五舍邊坡預定改善期程說明

(114.06.06更新)

工程發包及施工階段


完工驗收階段

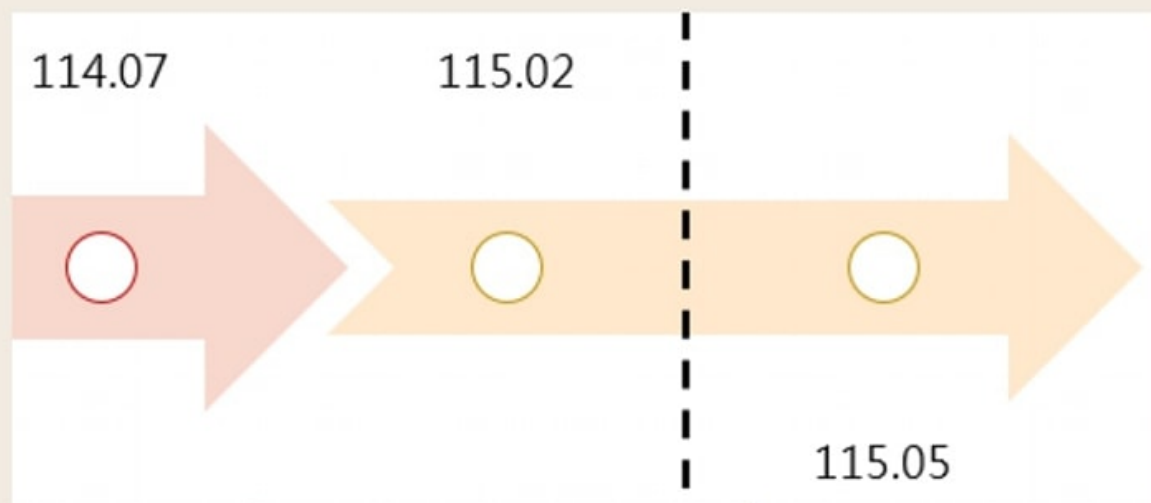

114.7.15上網發包
115.9.15工程開工
工期200日曆天

115.3.15
竣工完成

相關檢測及分析說明

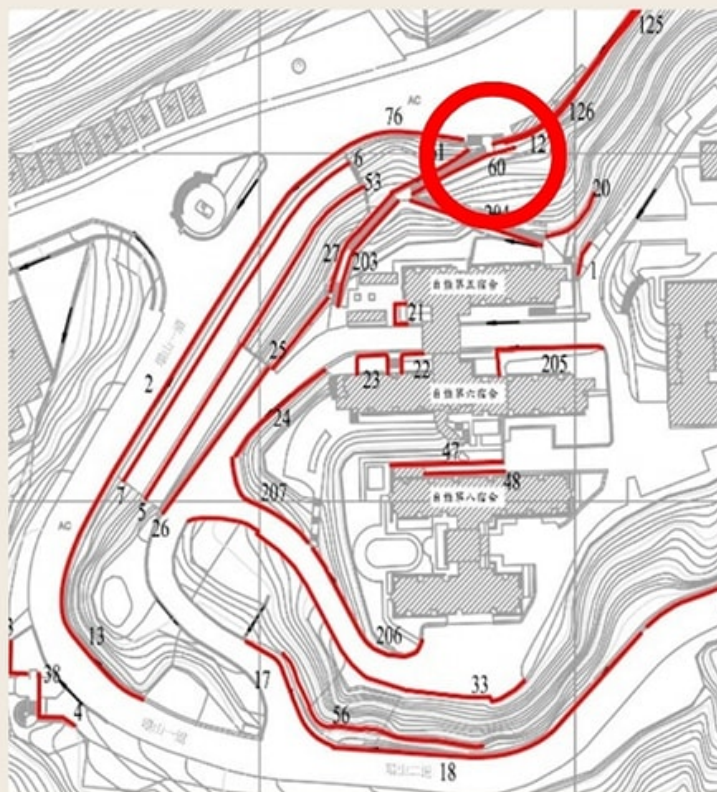

混凝土鑽心試驗

#60



氯離子含量為 0.461kg/m^3 ，高於 CNS 3090 規範值 0.15 kg/m^3 。若混凝土含有過高的氯離子，可能造成鋼筋加速鏽蝕，導致整體擋土牆面逐漸損壞。

試驗位置

人工邊坡編號#60

抗壓強度 (kgf/cm^2)	中性化深度 (cm)	氯離子含量 (kg/m^3)
374	0.1	0.461

相關檢測及分析說明


混凝土強度衝錘試驗

#203




混凝土檢測強度偏低

試驗位置	
人工邊坡編號#203	
檢測強度 (kgf/cm ²)	參考強度 (kgf/cm ²)
175	210

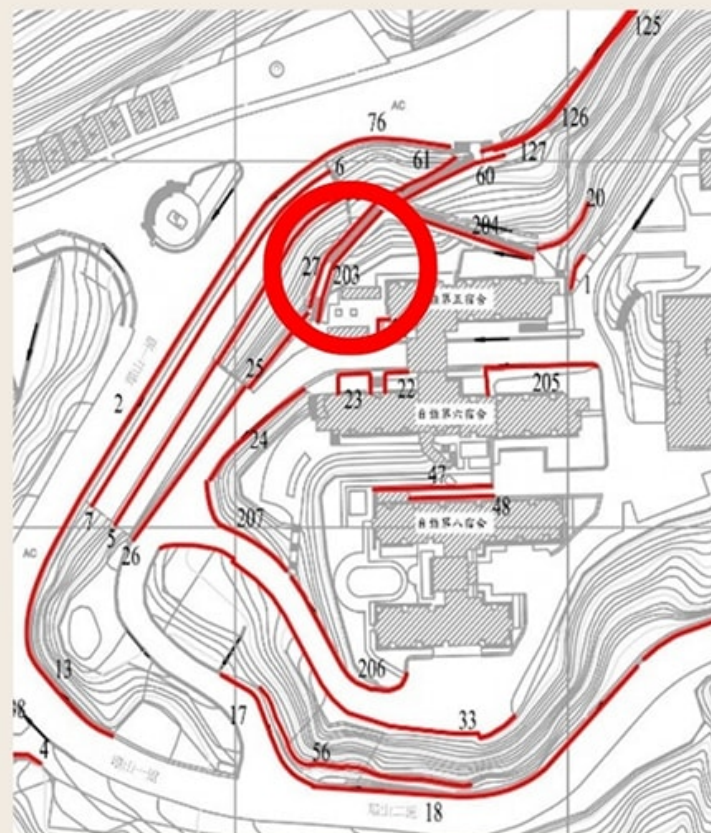



歷月傾度盤監測成果

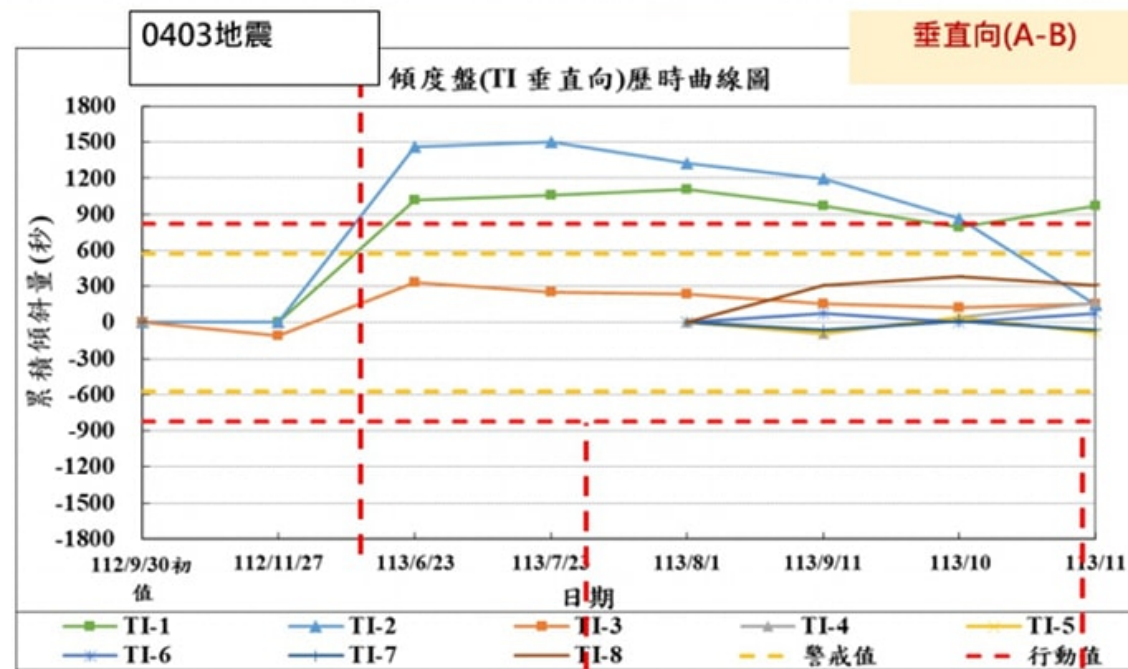

0724凱米颱風

1029康芮颱風

歷月傾度盤監測成果

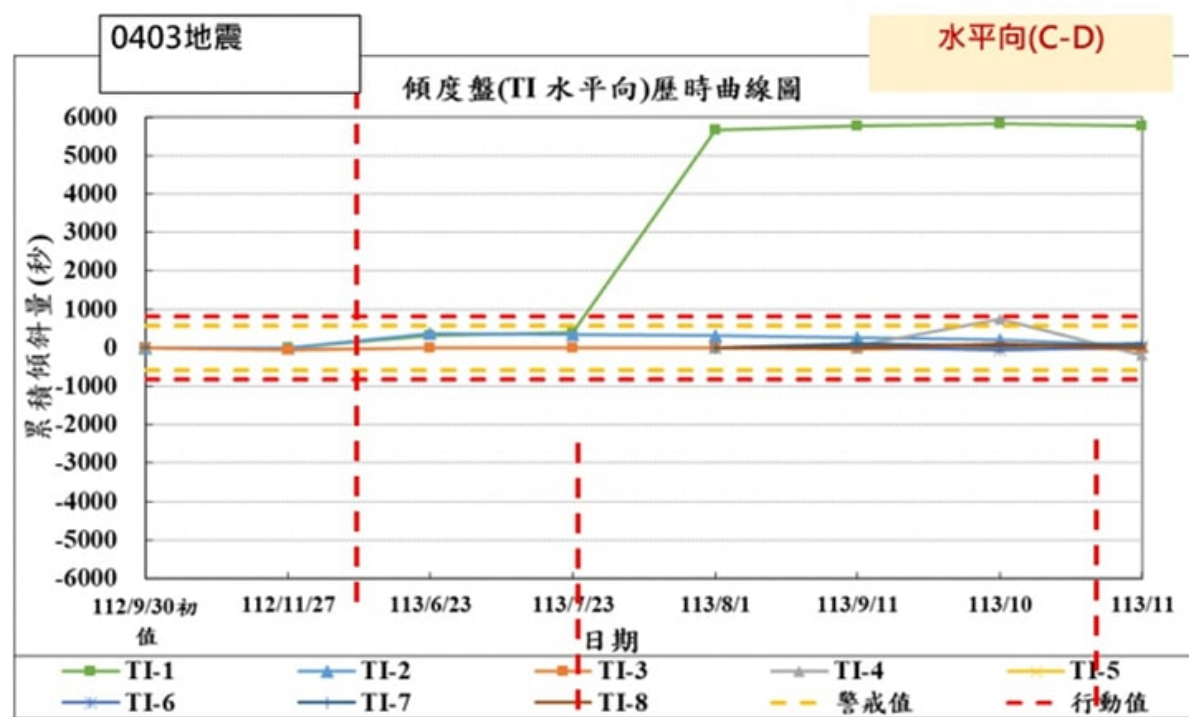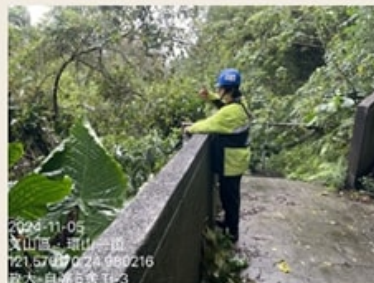

0724凱米颱風

1029康芮颱風

基本設計工程配置

