



麥側地坪前鋒計畫-2 與其他無障礙計畫 進度更新



@nccuga_b54

112年度無障礙設施改善執行情形

本校《大勇樓等無障礙設施及鋪面改善工程》，業於112年3月23日校基會第12屆第1次會議通過在案，同年6月30日以535萬元決標。


主要施作項目如下：

項次	工項名稱	經費占比
1	大勇樓二樓廁所整體改善工程 (含性別友善及無障礙廁所)	61.33%
2	大勇樓樓無障礙樓梯改善工程	8.67%
3	校門出入口無障礙通路改善工程	2.02%
4	校園麥側入口地坪改善工程	27.98%

整體執行情形


工程期限共計120日曆天，112年7月20日申報開工，預定完工日期為**10月17日**。

其中校園麥側入口地坪改善工程為戶外工程，進度受**天候因素影響**，持續協調廠商把握可施工時間、加緊趕工。

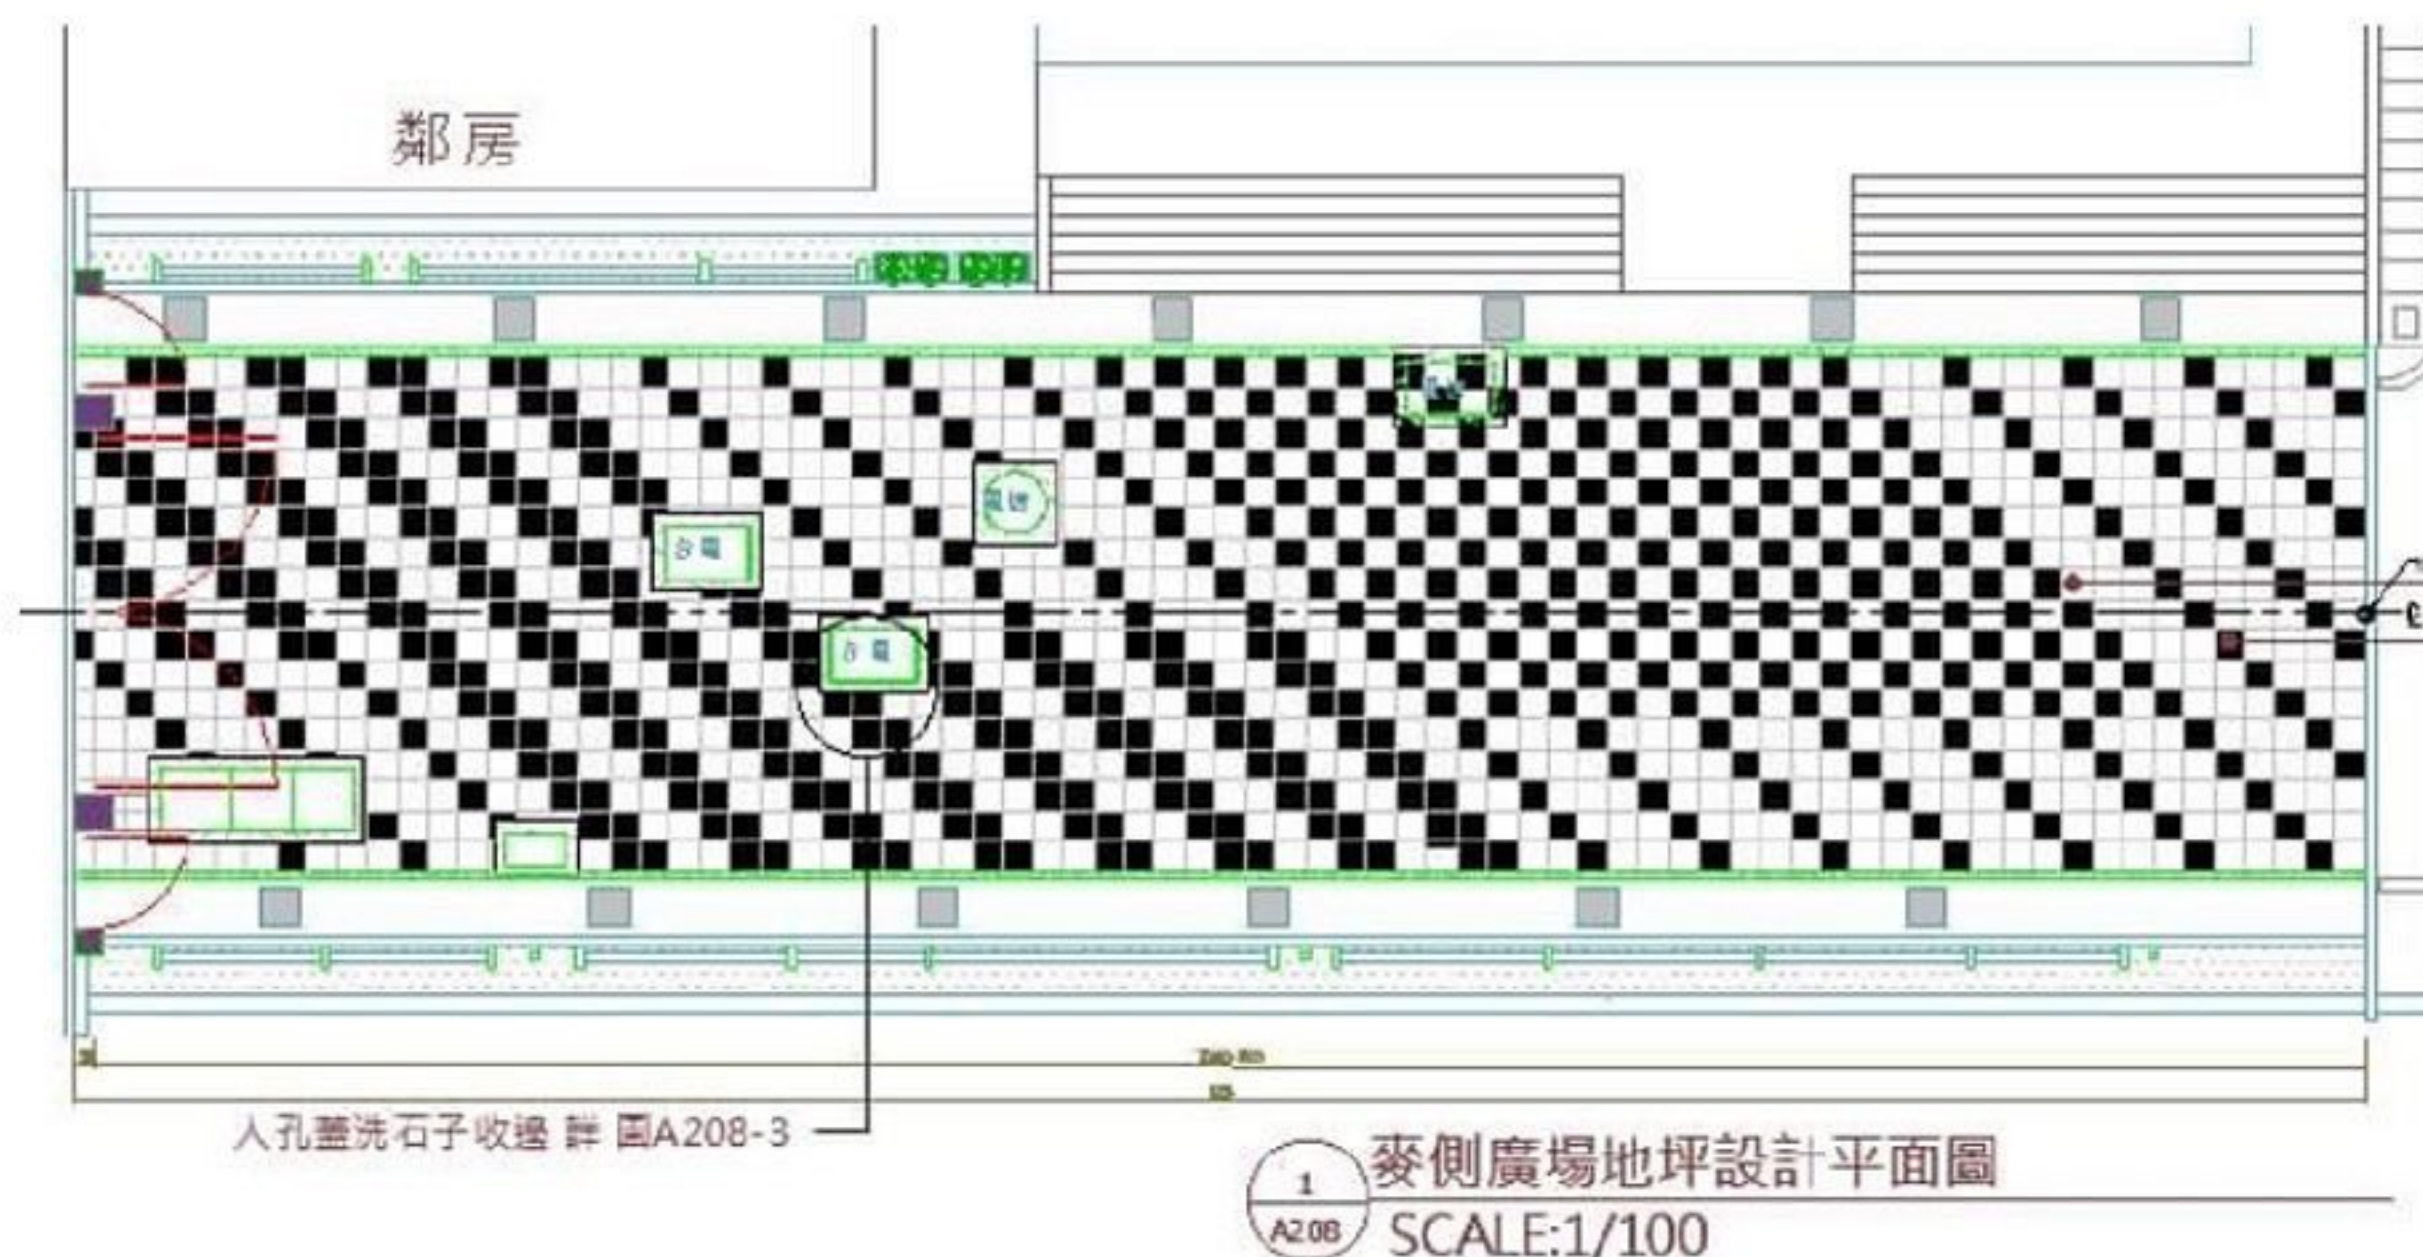

分項施工進度

1.大勇樓二樓廁所已完成舊有設施拆除、隔間砌磚，目前進行蹲式便器及污水管安裝、水電線路安裝等；預計將於**112年10月17日完成、暫定11月下旬完成驗收**。尚未完成驗收前大勇樓2樓廁所不能使用，請校內師長同學使用上下樓層廁所。

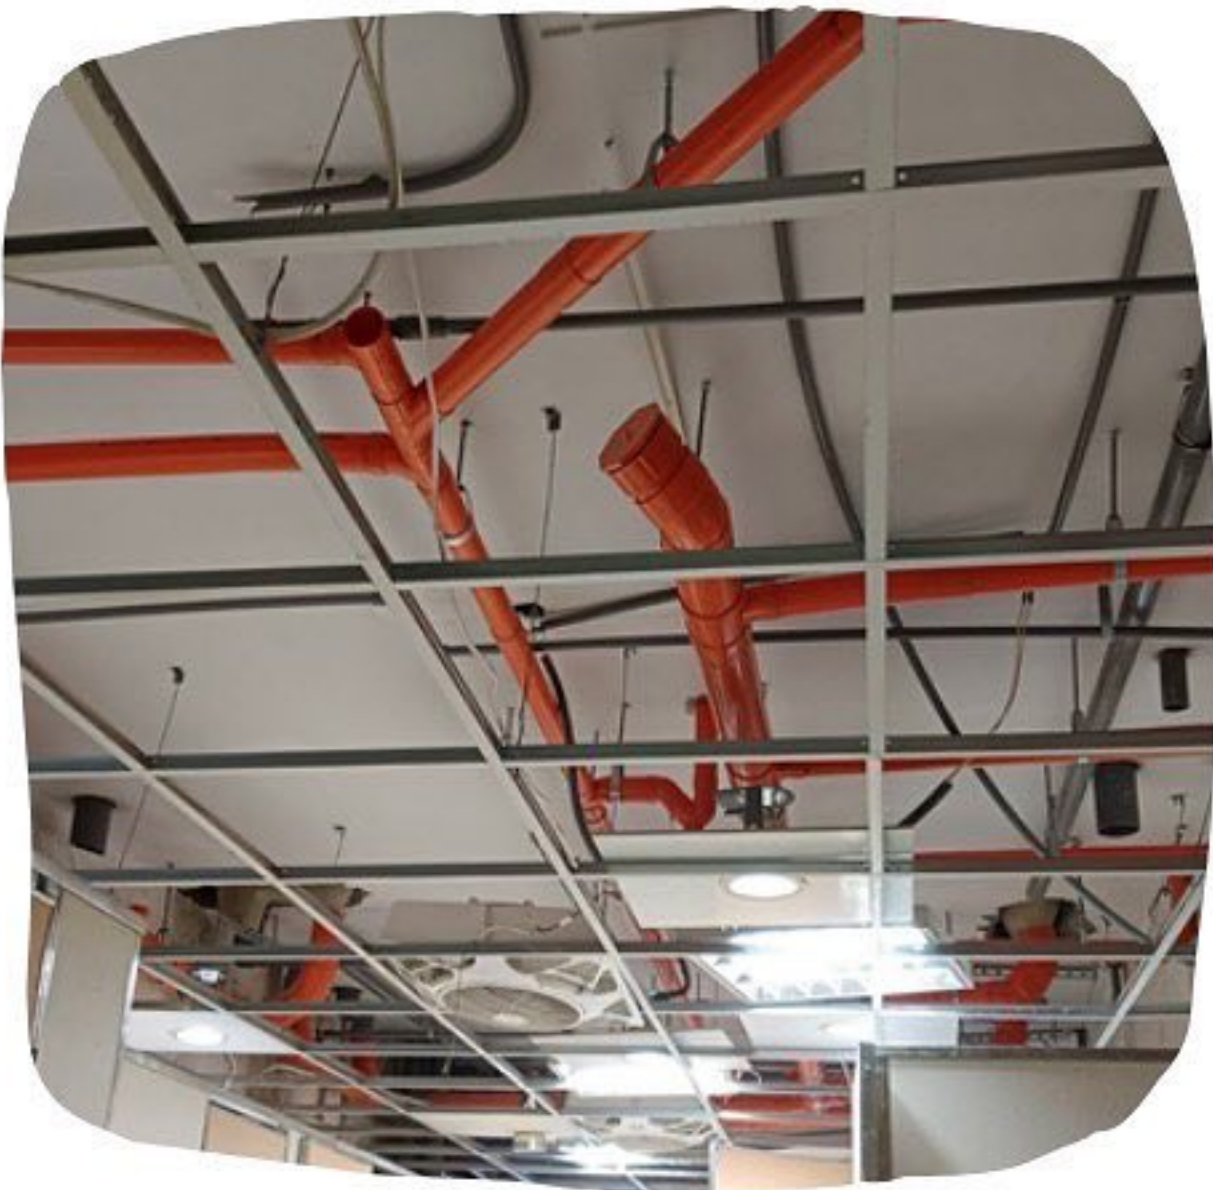

分項施工進度

2. 麥側地坪已完成舊有地坪拆除，目前進行廢棄物清運，預計將於**9月20日**完成透水磚鋪設並開放通行。未完成前請校內師長同學由大門、第八教室側通道、道南抽水站大智樓側通行。



3. 校門無障礙通路改善目前備料及放樣中，預計可於**9月10日前**完成。

4. 大勇樓無障礙樓梯改善目前備料及放樣中，預計可於**10月上旬**完成。
