



麥側鋪面障礙處理說明

麥側鋪面原訂於**9月11日**開放提供通行，因面臨施工障礙因素導致進度落後，緊急與建築師及承攬廠商檢討後，開放時間將延後至**10月1日**開放通行。

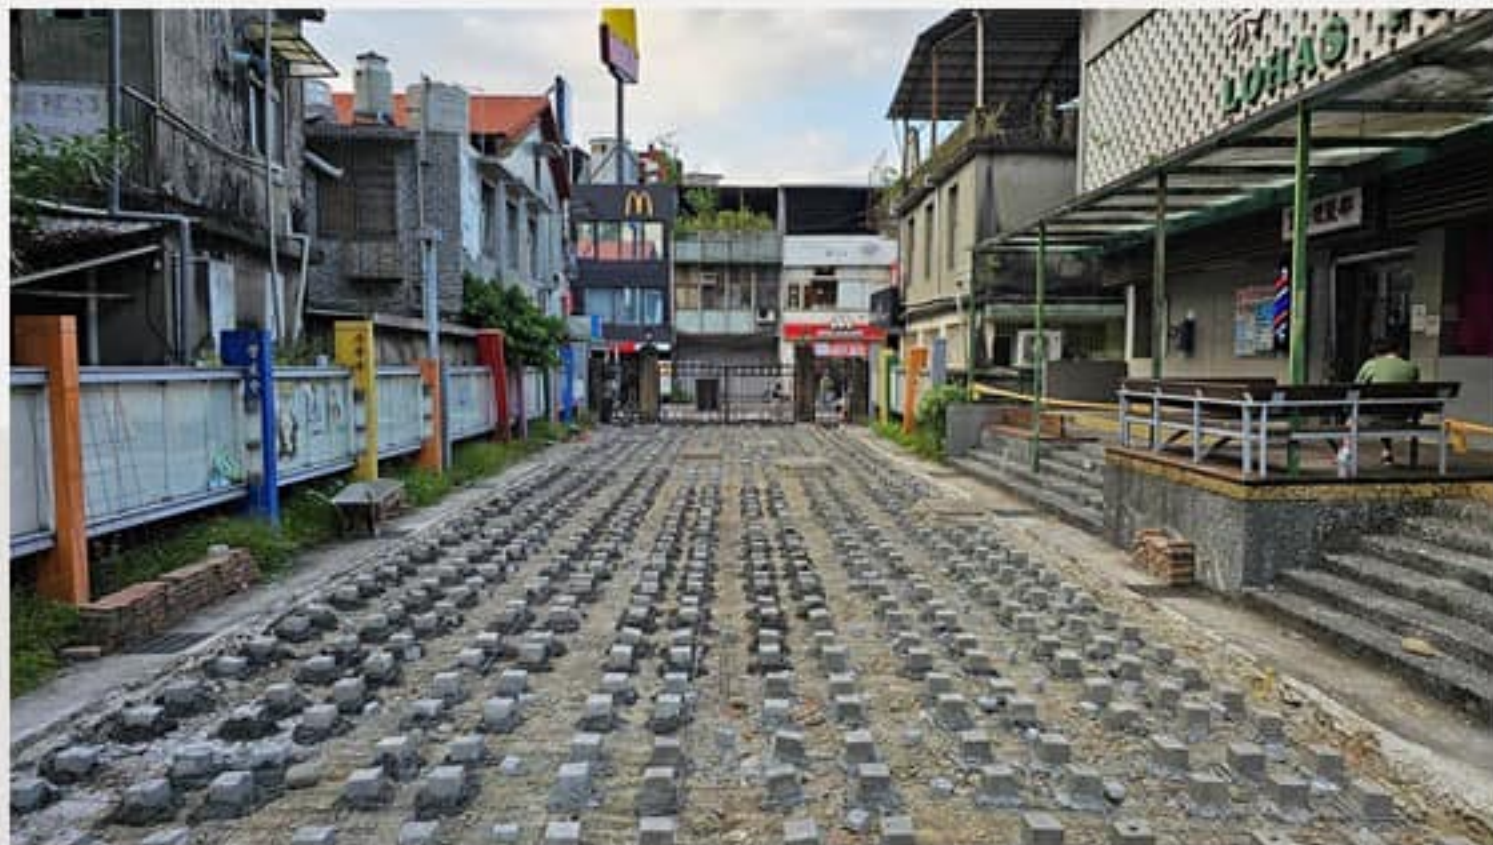

麥側鋪面工程障礙處理說明

遭遇困難	狀況說明	處理情形
舊有圖面資料缺乏	本案現地有綜合院管自來水閘區、台電、中華電信、汙水等多種系統之人孔及手孔，但管線深度及走向沒有明確圖資可確認，開挖階段需謹慎小規模敲除，難以用大型機具快速處理。	改採小規模敲除方式進行 ✓ 已解決
自來水設備老舊受損	因現地有綜院給水管線經過，自來水錶錶後的持壓閥非常老舊，遇有大規模震動時易造成零件受損；本案打鑿期間有搶修過1次，後續工程人員就必須更謹慎處理、務必避免影響綜合院館用水。	受損零件已修復 ✓ 已解決

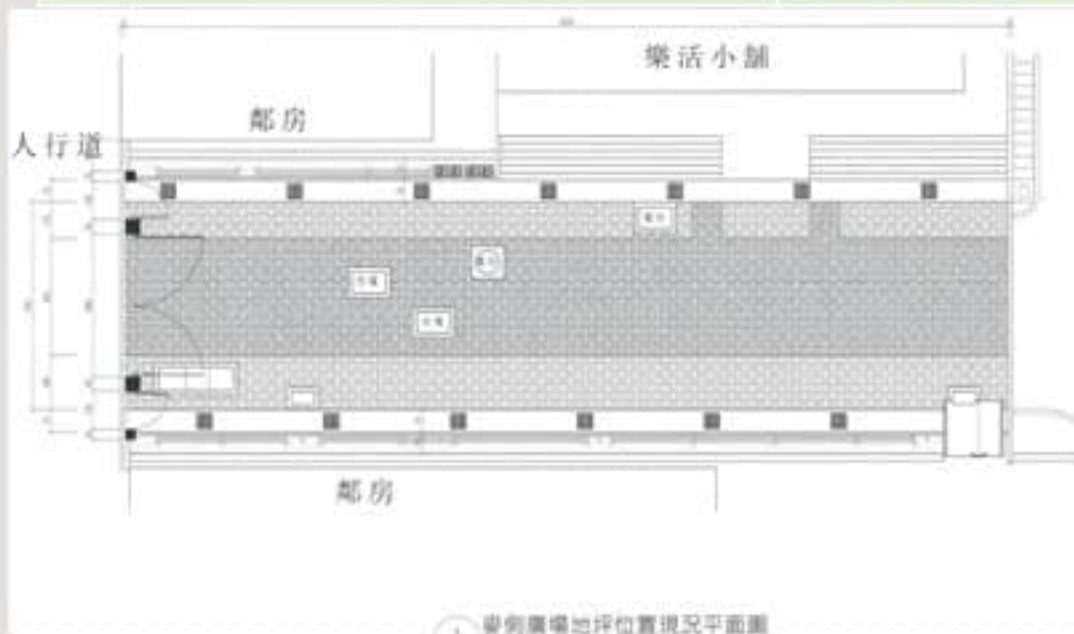

麥側鋪面工程障礙處理說明

遭遇困難

狀況說明

處理情形

廢棄物
處理方
式變更

既有面層打鑿後方得知原混凝土層下方並非原本預期的泥土層，而是屬於營建廢棄物(環保局分類編號為B8)，因此需改為外運處理的數量增加，廠商需申請運棄聯單及等待主管機關核准。又基地周邊難以提供土方暫置區(先清空基地)，因此土方是否可順利外運變成施工前期的影響因子。

混凝土下方營建廢棄物已清運



✓ 已解決

雨天影
響室外
施工

依總務處營繕組登記之晴雨表，8月份降雨日數多達15天，且多為豪大雨，其中5日為全日降雨。除戶外工作遇大雨、落雷、高溫需讓工作人員暫停施工以確保勞工安全外，多日雨天造成場地泥濘，亦增加機具整地難度。


已督促廠商於非雨天加派人手趕工



✓ 已解決

麥側鋪面工程障礙處理說明

遭遇困難	狀況說明	處理情形
鋪面配色調整	本次圖面配合全校性公共藝術計畫進行調整配色，工程發包後再次確認及修改整區配置，進而影響整磚計畫及磚料訂製進度。 ✓ 已解決	已依最新配色完成訂料及進料

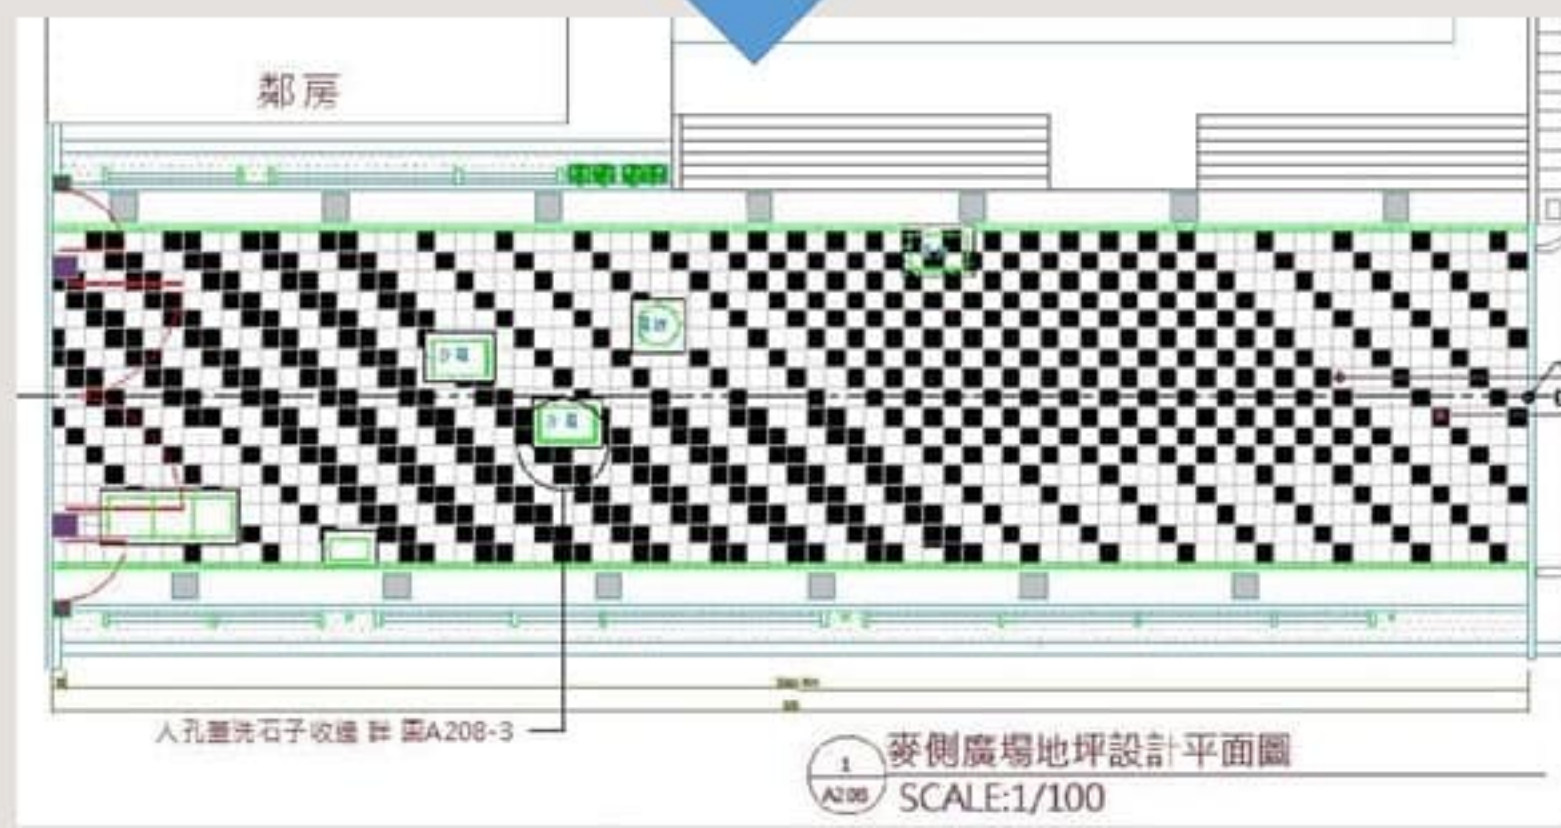

麥側鋪面工程障礙處理說明

遭遇困難	狀況說明	處理情形
公共工程持續缺工	全台灣公共工程缺工情形已持續達 3~4年，本次鋪面工程係與無障礙工程併同發包施工，希望於暑假開學前完成事項除了麥側以外，大勇樓廁所則要求廠商務必於開學前完成 1~2樓間的配管及復原1樓廁所舊有天花板，讓1樓廁間提供正常使用，避免廁所 1~2樓都封閉暫停使用的窘境；因此在此出工數有限狀況下，加上下雨導致戶外工作不斷被打斷，打鑿階段會調度工班以大勇樓施工為優先，避免人力浪費，但也導致成麥側的出工數遠不如大勇樓區域。	大勇樓一樓廁所已可使用、目前每日追蹤麥側當日及次日出工情形

!! 尚未解決、持續催辦!!



麥側鋪面工程障礙處理說明

遭遇困難	狀況說明	處理情形
進料延遲 影響工班 調度	麥側地磚量體不大，磚廠訂料過程均未將本案訂單列為優先供貨對象，因此選色完成至磚廠送料時間較預期增加，原本協調希望爭取排水磚(下層磚料)較面磚(上層磚料)提早先送，以爭取混凝土灌漿時間，但也因數量太少磚廠無法配合，同時也因到貨時間不確定導致增加排磚工班調度困難度，衍生磚已到貨但卻無工人可施工的窘境；目前每日與廠商積極催辦並確認出工人數，以利儘速完成鋪面工程。	按最新施工進度表督促廠商於前一周追蹤工班進駐情形

!! 尚未解決、持續催辦!!

