





公共空間廁所 分年整修執行情形



@nccuga_b54

公共空間廁所分年整修執行情形

- 本校公共空間廁所分年整修規劃案，業於111年12月26日及112年6月20日校基會第11屆第11次及第12屆第2次會議通過在案，112年執行大勇樓2樓、綜合院館1樓、研究大樓1樓廁所整修，其中綜合院館南北棟、研究大樓1樓廁所整修工程於112年7月27日以679萬8,831元整決標。
- 全案於112年8月15日召開施工協調會，112年8月21日申報開工，預定112年11月18日完工、12月下旬完成驗收。

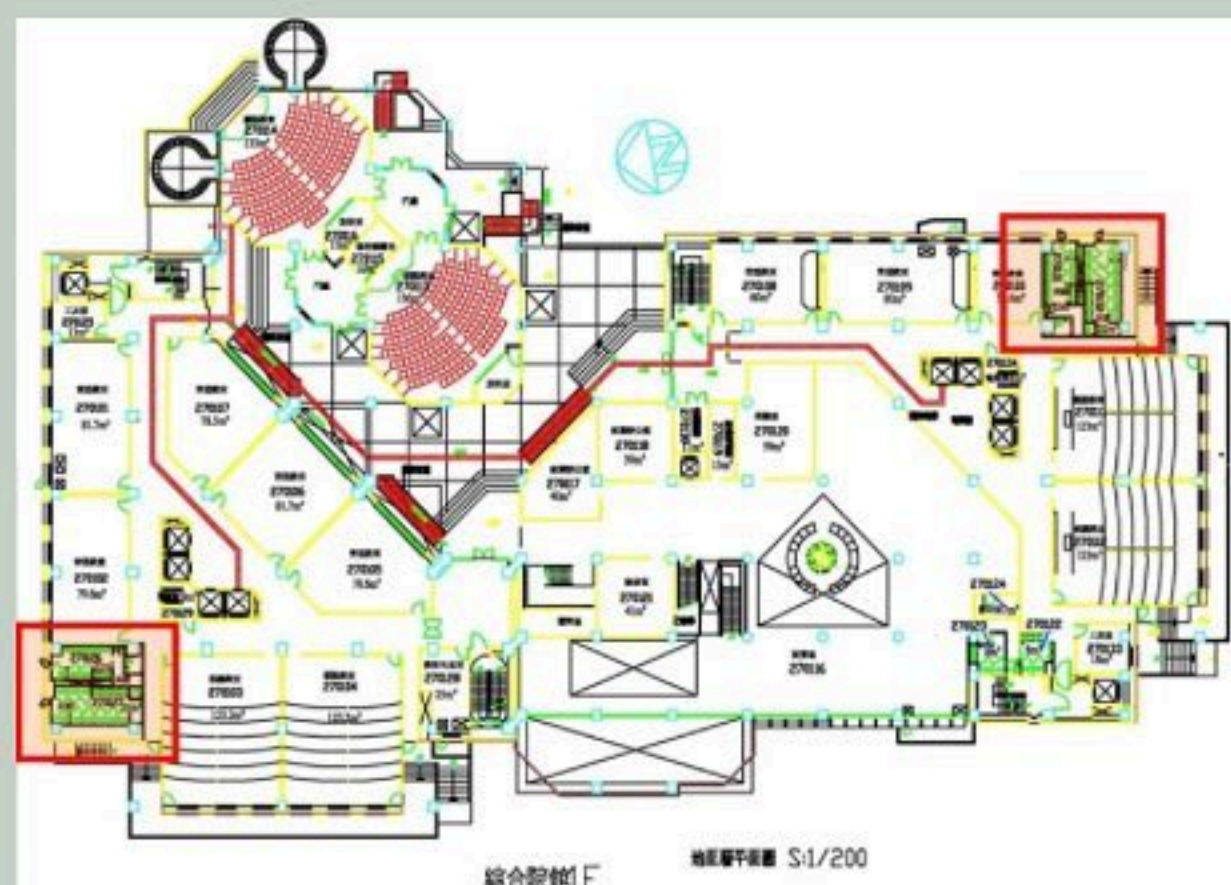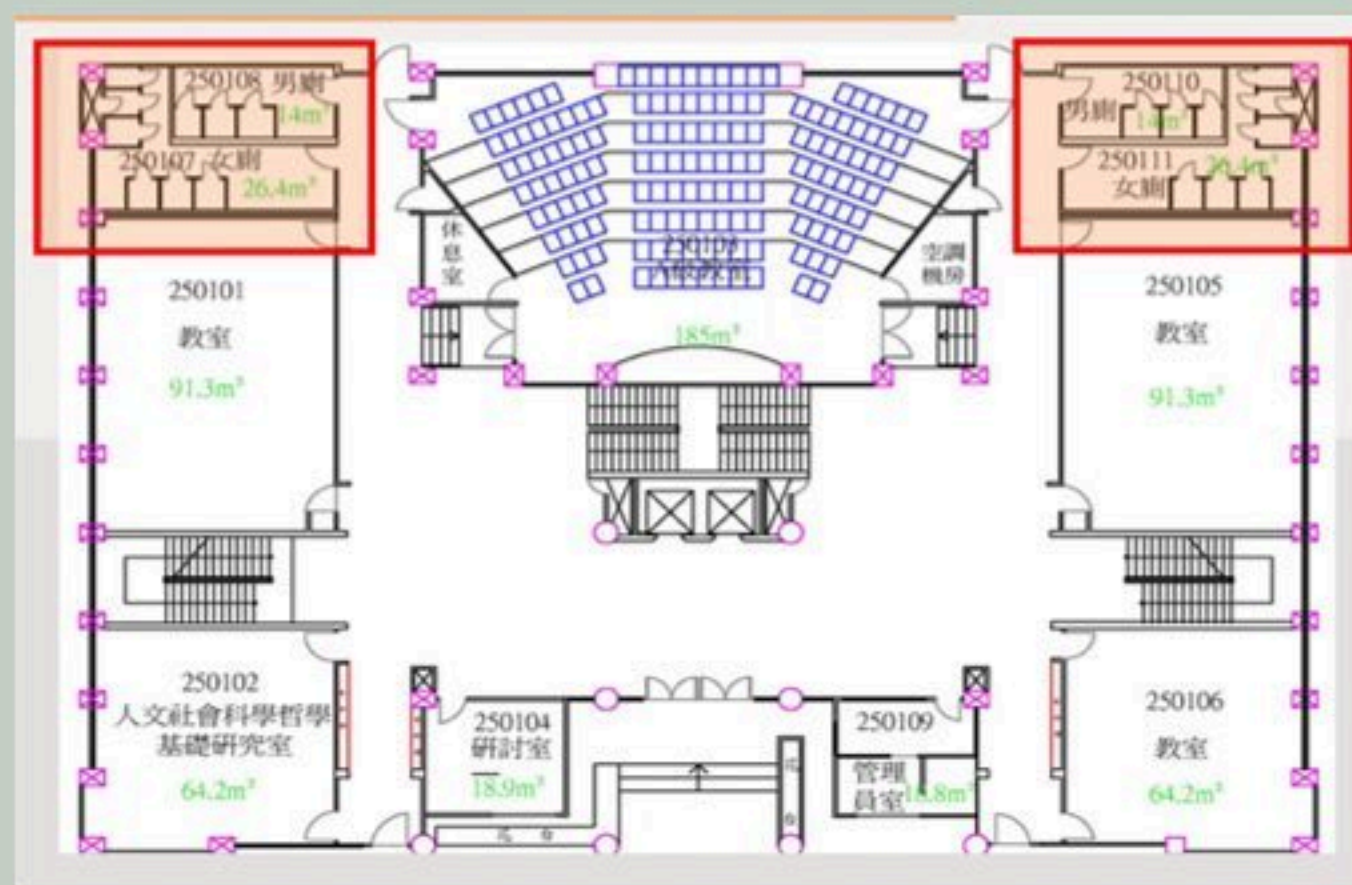

研究大樓1樓及綜合院館1樓現況圖

公共空間廁所分年整修執行情形

施工階段：

✎ 研究大樓於112年8月21日開始打除，目前已完成拆除作業，進行銑孔及污排水管配管、配電；綜合院館因北棟污水管路施工區域位於圖書館內、書圖須先撤離，該區延至9月1日開始打除，工程預定12月下旬完成驗收，尚未完成驗收前請校內師長同仁至其他樓層使用廁所。

✎ 本案施工區域影響校方單位多，除施工告示牌外，現場與電梯已張貼多張施工公告並於全校性網路公告，提醒各單位同仁及師生，行經作業區域敬請小心或繞道而行，並請至其它樓層使用廁所。

