

本校化南新村 磚牆修復工程



@nccuga_b54

化南新村磚牆修復工程進度說明

- 一、 臺北市政府文化局於**113年12月10日**現勘並進行磚牆修復書圖的初審，本校委託建築師依該局建議修正書圖。
- 二、 臺北市政府文化局於**114年2月27日**函覆**同意**聚落建築群「政治大學化南新村」圍牆緊急搶修計畫書圖。
- 三、 本校**114年3月5日**簽請辦理後續修復工程招標作業。




Progress Report on the Renovation of the Brick Wall at the Hua Nan Village, NCCU

1. On **December 10, 2024**, the Department of Cultural Affairs of Taipei conducted an **on-site inspection** and performed the initial review of the brick wall renovation drawings. The architect commissioned by the University has revised the drawings according to the recommendations.
2. On **February 27, 2025**, the Department of Cultural Affairs of Taipei issued **a letter of approval** for the emergency repair plan and drawings for the "National Chengchi University Hua Nan New Village" perimeter wall.
3. On **March 5, 2025**, National Chengchi University signed off the document on proceeding with the subsequent bidding process for the restoration work.


臺北市政府文化局於113年12月10日現勘， 進行磚牆修復書圖的初審



臺北市府文化局於114年2月27日函覆 同意化南新村磚牆緊急搶修計畫書圖

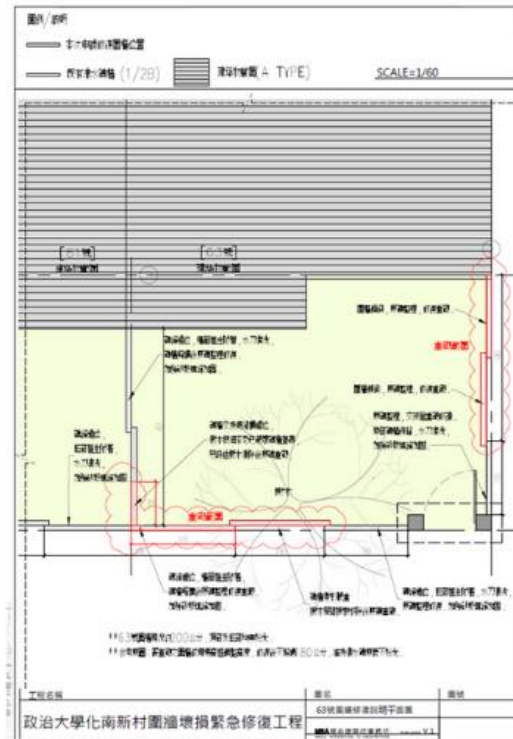

超高性能混凝土(UHPC) - 抗拉性質

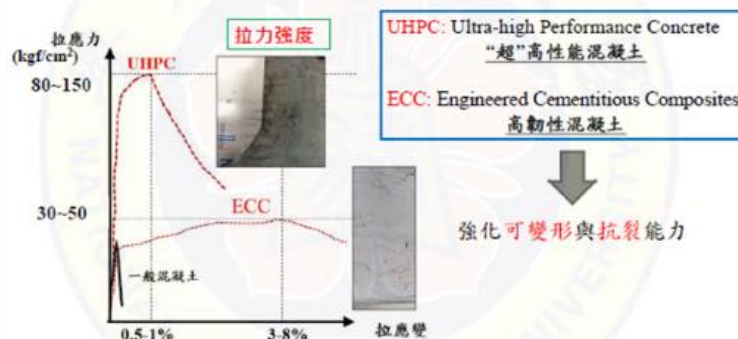

超高性能混凝土: 一種新型纖維混凝土 Ultra-High Performance Concrete(UHPC)



時程（依招標與天候滾動式調整）

113 年	10月	本校現勘並通報臺北市政府文化局
	11月	
	12/10	臺北市政府文化局現勘，審查磚牆修復書圖
114 年	↓	↓
	2/27	臺北市政府文化局函覆同意磚牆修復書圖
	3/5	本校簽請辦理修復工程招標程序
	4/5	工程招標完成
	5/5	修復工程開工
	7/5	修復工程竣工
	8/5	工程驗收完成
